



**ACOMPANHAMENTO DE OBRAS
PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS - PLE
REGISTRO EXECUÇÃO**

EMPRESA

**Departamento de Transferências da União
Secretaria de Gestão
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
MINISTÉRIO DA ECONOMIA**


Registro da execução das OBRAS diretamente na Plataforma +Brasil pela empresa EXECUTORA.

Existem, aproximadamente, 14.000 (quatorze) mil obras sendo acompanhadas pelo meio físico “papel”. O fluxo antigo gera dificuldades, visto que não há agilidade no processo, transparência ou integridade dos dados. Pensando nisso a Plataforma +Brasil deu um grande passo: lançou mais uma evolução em seu **Módulo de Obras**, otimizando as etapas de **Projeto Básico, Licitação, Contratos e Acompanhamento das Obras (acompanhadas por eventos)**.

Vamos entender o fluxo??



Fluxo EMPRESA – Registro do processo de execução da Obra.

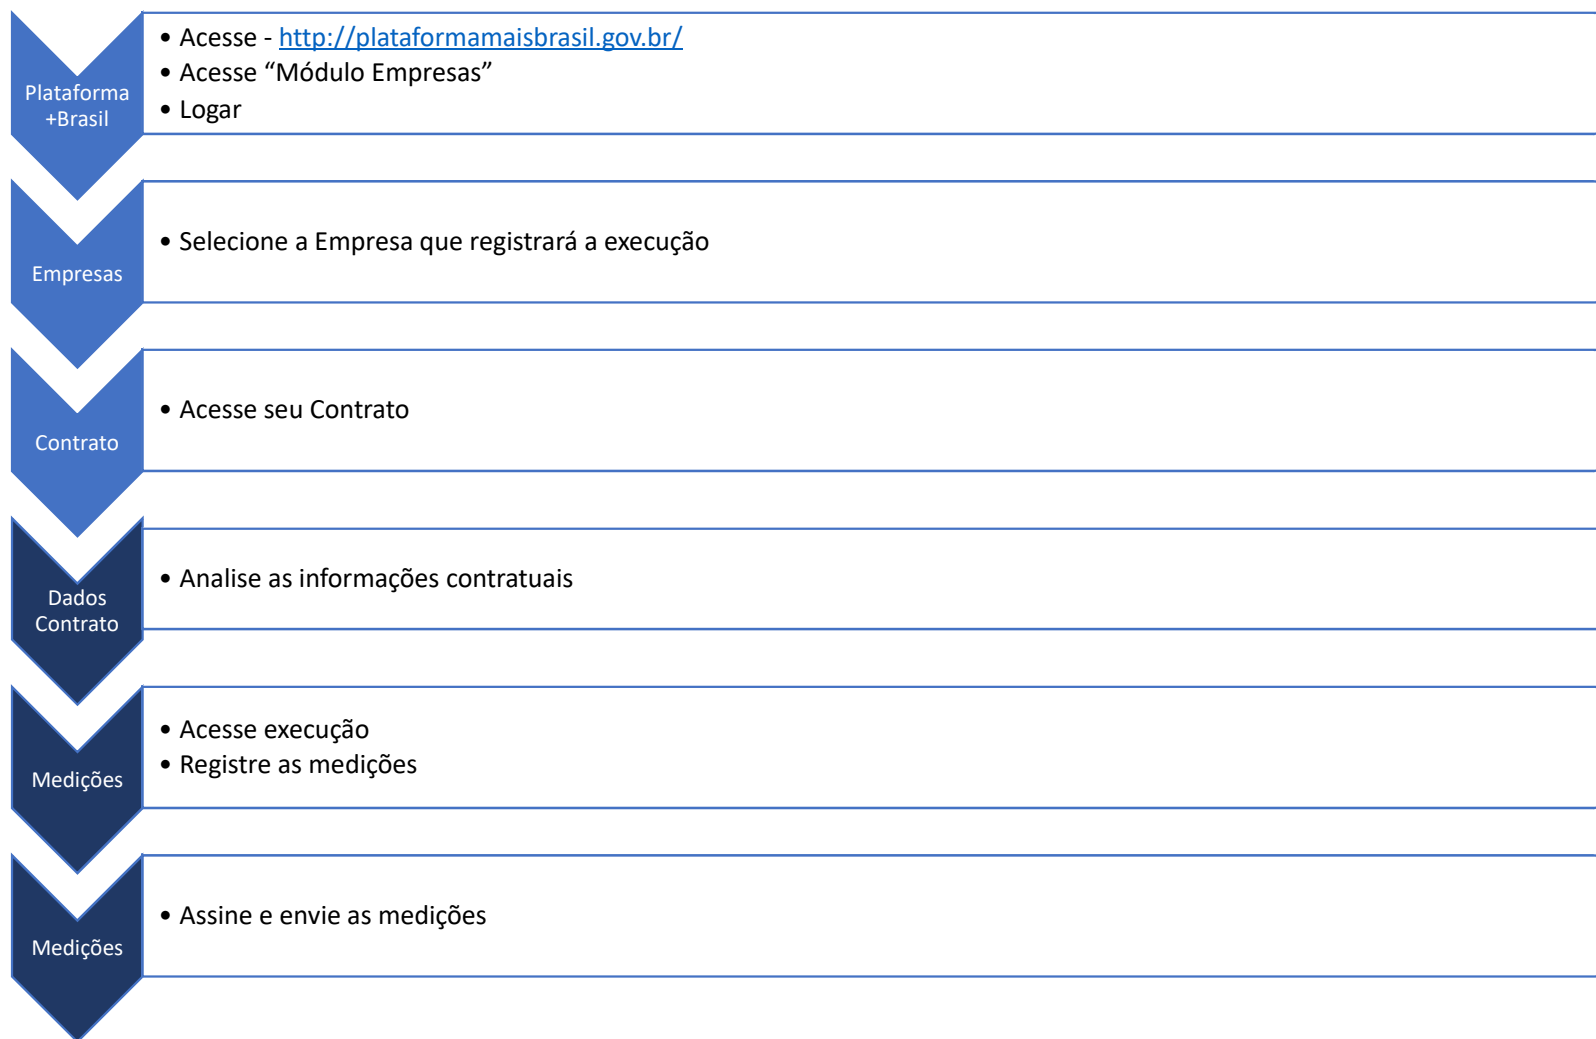

Registrar um processo de execução de OBRAS na Plataforma +Brasil.

Para seguir os passos seguintes, é necessário que a EMPRESA

- Tenha o perfil selecionado abaixo; e
- Esteja **logado** no sistema.

Perfis Associados ao Usuário

☐

Cadastrador da Empresa

☒

Operacional da Empresa



O Cadastrador de Usuário do Ente/Entidade poderá dar o perfil para os usuários.

plataformamaisbrasil.gov.br

BRA SIL

CORONAVÍRUS (COVID-19)

Simplifique!

Participe

Acesso à informação

Legislação

Canais



Ir para o conteúdo ¹ Ir para o menu ² Ir para a busca ³ Ir para o rodapé ⁴

ACESSIBILIDADE ALTO CONTRASTE MAPA DO SITE

Ministério da Economia

Plataforma +BRASIL

Buscar no portal



Sobre a Plataforma

#Rede+BRASIL

Dados e Estatísticas

Perguntas Frequentes

Contato

ACESSO AOS SISTEMAS

Acesso à
Plataforma
+Brasil

Cadastramento
Proponente

Painéis
Gerenciais
+BRASIL

Aplicativos
+BRASIL

Acesso Livre

Acesso ao
ambiente de
Treinamento

Sistema de

Clique no local
indicado.

gov.br

Legislação Acessibilidade Acesso à Informação Português▼ Acesso GOVBR

Rede +Brasil

O que você procura?

Pesquise em gov.br/redemaisbrasil



Fale com seu Coordenador Estados Participantes Calendário Capacitação MEG-Tr Sistema de Gestão R+B

Portal da Rede +BRASIL Reformulado

Últimas Notícias



Dúvidas sobre convênios?
Pergunte para Isis!





Bem-vindo à Plataforma +Brasil

A **Plataforma +Brasil** constitui ferramenta integrada e centralizada, com dados abertos, destinada à informatização e à operacionalização das transferências de recursos oriundos do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social da União a órgão ou entidade da administração pública estadual, distrital, municipal, direta ou indireta, consórcios públicos e entidades privadas sem fins lucrativos.

Para acessar os módulos da Plataforma +Brasil, clique nos cards abaixo:



Selecione a opção “Módulo Empresa” para iniciarmos as medições.

Se possuir cadastro no GOV.br, informe seu CPF e clique em avançar. Informe sua senha na próxima tela.



Uma conta gov.br garante a identificação de cada cidadão que acessa os serviços digitais do governo.

Crie sua conta gov.br

Digite seu CPF

Acesse sua conta com

Número do CPF

Caso não lembre se possui uma conta, digite o número do seu CPF mesmo assim para verificar.

CPF

Digite seu CPF

Avançar

Clique

Caso ainda não tenha cadastro no gov.br, crie sua conta, clicando no botão acima.



Digite sua senha para acessar o login único do governo federal.

**Registre
sua senha e
clique em
entrar.**

Digite sua senha

CPF

Senha

Digite sua senha atual



[Esqueci minha senha](#)

Cancelar

Entrar

Clique

[Dúvidas frequentes](#)

**Este passo pode não ocorrer.
É apenas uma medida de
segurança do GOV.BR.**

Confirmação de contato

Para prosseguir para **Plataforma - Brasil** é necessário atualizar o seu cadastro.

Celular:

Enviar código

Clique

O sistema PODERÁ solicitar seu número de celular para enviar um código de validação de acesso. Informe seu número e clique em “Enviar código”.

Após receber o código, informe-o no campo em destaque e clique em “Validar Código”. Se não receber o código, basta clicar em “Tentar novamente”.

Confirmação de contato

Confirmar SMS

Código enviado. Verifique as mensagens SMS no seu celular.

Código de confirmação SMS:

Digite o código recebido por Si

Informe

Tentar novamente

Validar código

Clique

MEDICÃO

Selecionar Empresa

Escolha uma empresa para iniciar o processo de medição

Ao acessar a Plataforma +Brasil, serão exibidos o nome e a quantidade de contratos das empresas que o usuário tenha vínculo.



2 contratos

Empresa 01



0 contrato

Empresa 02



1 contrato

Empresa 03

Clique

Vamos analisar o caso em tela.

O usuário 01, logou e foram exibidos o nome de 3 empresas. Elas estão cadastradas na Plataforma +Brasil e esse usuário possui perfil "Operacional Empresa" nas três. Observe que a Empresa pode estar cadastrada, mas não possuir nenhum contrato ativo.

Selecione a empresa que possui o contrato que será executado. Clique no nome da empresa, conforme indicado.

MEDIÇÃO

Selecionar Contrato de Execução e/ou Fornecimento

Escolha um dos contratos abaixo para realizar medições.

Serão exibidos, com quadro resumo, todos os contratos vinculados à empresa.

Empresa

Contratos

CONTRATO DE EXECUÇÃO E/OU FORNECIMENTO 123

Tutorial - Contrato

VALOR TOTAL DO CONTRATO
R\$ 124.600,00

QUANTIDADE DE MEDIÇÕES CADASTRADAS
0

TERMO DE COMPROMISSO
940147/2021

UF
--

OBJETO DO TERMO DE COMPROMISSO
Proposta - Teste -



Clique

Para exibir detalhes do instrumento contratual, clique no ícone indicado.

CONTRATO DE EXECUÇÃO E/OU FORNECIMENTO 123

objeto

1 dias

VALOR TOTAL DO CONTRATO
R\$ 125.000,00

QUANTIDADE DE MEDIÇÕES CADASTRADAS
1

TERMO DE COMPROMISSO
940146/2021

UF

OBJETO DO TERMO DE COMPROMISSO
Proposta - Teste -



Identificação do Contrato

Objeto contratado

290 dias Quantidade de dias sem medição

VALOR TOTAL DO CONTRATO
Valor do instrumento

QUANTIDADE DE MEDIÇÕES CADASTRADAS
1

CONTRATO DE REPASSE
869196/2018

UF

OBJETO DO CONTRATO DE REPASSE

Objeto do instrumento

CONTRATO DE EXECUÇÃO E/OU FORNECIMENTO 111

Objeto - Submeta 1

9 dias

VALOR TOTAL DO CONTRATO
R\$ 62.500,00

QUANTIDADE DE MEDIÇÕES CADASTRADAS
1

TERMO DE COMPROMISSO
940137/2021

UF

OBJETO DO TERMO DE COMPROMISSO
teste -



Voltar

MEDICÃO

Dados Gerais

Configuração de Contratos de Execução e/ou Fornecimento

Nessa primeira aba serão apresentados os responsáveis técnicos pelo projeto.

▼ Termo de Compromisso 940147/2021

▼ Contrato de Execução e/ou Fornecimento 123

Para saber mais informações sobre os responsáveis, clique no ícone indicado.

Responsável Técnico ART / RRT Documentação Complementar

Responsável Técnico

CPF	Nome	Atividade	Tipo	CREA / CAU	Data Inclusão	Ações
CPF	Nome	Engenharia	Fiscalização	CREA	14/05/2021	
CPF	Nome	Engenharia	Execução	CREA	14/05/2021	

Clique

● Responsável Técnico com ART ativa

Exportar o conteúdo dessa tabela no formato [TXT](#), [CSV](#), [XLS](#), [PDF](#) ou [XML](#)

Itens por pág. 10

Se um dos usuário já possuir ART ou RRT cadastrado e ativo no projeto básico o sistema indicará.

Tipo:
Fiscalização – Responsável ligado ao conveniente.
Execução – Responsável ligado a empresa.

Voltar

MEDIÇÃO

Dados Gerais

Configuração de Contratos de Execução e/ou Fornecimento

▼ Termo de Compromisso 940147/2021

▼ Contrato de Execução e/ou Fornecimento 123

Responsável Técnico

Tipo

- ☐ Execução
☒ Fiscalização

Data Inclusão

14/05/2021

Após detalhar os dados do responsável, clique em “Voltar”.

Identificação

Nome do responsável

E-mail

E-mail do responsável

Telefone

Tel. do responsável

Registros Profissionais

Associar	Atividade	CAU	CREA	UF
☒	Engenharia		121323	RN

Exportar o conteúdo dessa tabela no formato [TXT](#), [CSV](#), [XLS](#), [PDF](#) ou [XML](#)

Itens por pág. 10

« < 1 > »

Voltar

MEDIÇÃO

Dados Gerais

Configuração de Contratos de Execução e/ou Fornecimento

Para visualizar os documentos técnicos, clique na aba “ART/RRT”, em destaque.

▼ Termo de Compromisso 940147/2021

▼ Contrato de Execução e/ou Fornecimento 123

Responsável Técnico

ART / RRT

Documentação Complementar

Anotação / Registro de Responsabilidade Técnica

Tipo	ART / RRT	Data de Emissão	Responsável Técnico	Submetas	Data de Inativação	Arquivos	Ações
Fiscalização	123	14/05/2021	Nome	1.1 - Submeta: Execução da Pavimentação da Parte 1		↓ ART.p	🔍
Execução	12345	14/05/2021	Nome	1.1 - Submeta: Execução da Pavimentação da Parte 1		↓ ART.pdf	🔍

Exportar o conteúdo dessa tabela no formato [TXT](#), [CSV](#), [XLS](#), [PDF](#) ou [XML](#)

Itens por pág. 10



Os documentos inseridos podem ser baixados, usando a opção  ou detalhados, clicando no ícone indicado.

Voltar

MEDICÃO

Dados Gerais

Configuração de Contratos de Execução e/ou Fornecimento

▼ Termo de Compromisso 940147/2021

▼ Contrato de Execução e/ou Fornecimento 123

Anotação de Responsabilidade Técnica / Registro de Responsabilidade Técnica

ART / RRT

Documento técnico

Data de Emissão

14/05/2021



Tipo ART / RRT

- ☐ Execução
☒ Fiscalização

Responsável Técnico

Responsável técnico



Anexo

ART.pdf

Submetas Associadas

Origem

Destino

1.1 - Submeta: Execução da Pavimentação da Parte 1



Associação do responsável técnico a seus documentos e a submeta de sua responsabilidade.

Clique

Voltar

MEDIÇÃO

Dados Gerais

Configuração de Contratos de Execução e/ou Fornecimento

▼ Termo de Compromisso 940147/2021

▼ Contrato de Execução e/ou Fornecimento 123

Responsável Técnico

ART / RRT

Documentação Complementar

Documentação Complementar

Tipo de Documento	Tipo Manifesto Ambiental	Órgão Emissor	Data de Emissão	Válido Até	Submetas	Arquivo	Ações
Ordem de Serviço		PM XYZ	14/05/2021			📄 MODELO TUTORIAL.pdf	🔍

Exportar o conteúdo dessa tabela no formato [TXT](#), [CSV](#), [XLS](#), [PDF](#) ou [XML](#)

Itens por pág. 10 ⌵ ⏪ < 1 > ⏩

Documentações complementares que foram inseridas poderão ser baixadas, clicando em 📄.

Podem ser detalhadas clicando em 🔍.

Um exemplo muito importante de documentação complementar é a ORDEM DE SERVIÇO, sem esse documento não poderemos iniciar a execução da obra.

Voltar

Clique

MEDICÃO

Selecionar Contrato de Execução e/ou Fornecimento

Escolha um dos contratos abaixo para realizar medições.

Empresa

Contratos

CONTRATO DE EXECUÇÃO E/OU FORNECIMENTO 123

Tutorial - Contrato

VALOR TOTAL DO CONTRATO
R\$ 124.600,00

QUANTIDADE DE MEDIÇÕES CADASTRADAS
0

TERMO DE COMPROMISSO
940147/2021

UF
--

OBJETO DO TERMO DE COMPROMISSO
Proposta - Teste -



Clique

Para as registrar as medições, clique no ícone indicado.

CONTRATO DE EXECUÇÃO E/OU FORNECIMENTO 111

Objeto - Submeta 1

9 dias

VALOR TOTAL DO CONTRATO
R\$ 62.500,00

QUANTIDADE DE MEDIÇÕES CADASTRADAS
1

TERMO DE COMPROMISSO
940137/2021

UF

OBJETO DO TERMO DE COMPROMISSO
teste -



CONTRATO DE EXECUÇÃO E/OU FORNECIMENTO 123

objeto

1 dias

VALOR TOTAL DO CONTRATO
R\$ 125.000,00

QUANTIDADE DE MEDIÇÕES CADASTRADAS
1

TERMO DE COMPROMISSO
940146/2021

UF

OBJETO DO TERMO DE COMPROMISSO
Proposta - Teste -



Identificação do Contrato

Objeto contratado

290 dias Quantidade de dias sem medição

VALOR TOTAL DO CONTRATO
Valor do instrumento

QUANTIDADE DE MEDIÇÕES CADASTRADAS
1

CONTRATO DE REPASSE
869196/2018

UF

OBJETO DO CONTRATO DE REPASSE

Objeto do instrumento



🏠 / Empresas / Contratos / Medição / Listar Medição

MEDIÇÃO

Medições

Lista de Medições Efetuadas

▼ Termo de Compromisso 940147/2021

▼ Contrato de Execução e/ou Fornecimento 123

Medições

Histórico

Medições

Nenhum registro encontrado.

Clique

Criar Medição

No primeiro acesso não haverá medições exibidas, mas a medida que forem ocorrendo serão exibidas e listadas aqui.

Clique em “Criar Medição”, conforme indicado, para iniciar o processo de registro.

Voltar

MEDIDAÇÃO

Medição 1

Informe os dados para iniciar uma medição

▼ Termo de Compromisso 940147/2021

▼ Contrato de Execução e/ou Fornecimento 123

Medição

Medição

Data de Início do Objeto



Data no formato dd/mm/aaaa

Data de Início da Medição

Data Fim da Medição



Data no formato dd/mm/aaaa

Primeiramente, informe a data de início do objeto, essa será considerada a data de início da medição.

Informe também a data fim da medição e clique em “Salvar Medição”, conforme indicado.

Clique

Voltar

Salvar Medição

/ Empresas / Contratos / Medição / Alterar Medição

✓ Medição salva com sucesso.

MEDIÇÃO

Medição 1

Escolha uma submeta abaixo para realizar medições.

Após registrar as datas de início e fim da medições, a submeta do projeto básico será exibida. Clique em editar, conforme indicado para registrar as medições.

▼ Termo de Compromisso 940147/2021

▼ Contrato de Execução e/ou Fornecimento 123

Medição

Observações

Medição

Data de Início do Objeto

14/05/2021



Data no formato dd/mm/aaaa

Data de Início da Medição

14/05/2021

Situação

Em Elaboração

Data Fim da Medição

14/05/2021



Data no formato dd/mm/aaaa

Submetas

Descrição	Valor (R\$)	Realizado	Empresa		Conveniente		Concedente		Ações
			R\$	%	R\$	%	R\$	%	
1.1 - Submeta: Execução da Pavimentação da Parte 1	124.600,00	Período Acumulado							Clique
Total	124.600,00	Período Acumulado							

Exportar o conteúdo dessa tabela no formato [TXT](#), [CSV](#), [XLS](#), [PDF](#) ou [XML](#)

Itens por pág. 10

▼

« < 1 > »

Voltar

Salvar Medição

/ Empresas / Contratos / Medição / Alterar Medição / Preencher Medição Submeta

MEDIDAÇÃO

Preencher Medição 1

Informe Abaixo quais Eventos foram Concluídos na Medição

A submeta será detalhada, exibindo todos os eventos que deveriam ser executados, bem como seus valores.

▼ Termo de Compromisso 940147/2021

▼ Contrato de Execução e/ou Fornecimento 123

Medição

Data de Início do Objeto
14/05/2021

Data de Início da Medição
14/05/2021

Situação
Em Elaboração

Data Fim da Medição
14/05/2021

1.1 - Submeta: Execução da Pavimentação da Parte 1

— Frente de Obra: RUA A

Evento / Descrição do Serviço	Valor do Evento (R\$)	Qtde.	Unid.	Concluído Empresa	Concluído Conveniente	Concluído Concedente
▶ SERVIÇOS PRELIMINARES	7.700,00			☐		
▶ MOVIMENTO DE TERRA	1.800,00			☐		
▶ PAVIMENTAÇÃO	44.594,00			☐		
▶ RAMPAS DE ACESSIBILIDADE	6.750,00			☐		
▶ DIVERSOS	1.456,00			☐		

Voltar

Salvar Rascunho

Assinar

▼ Termo de Compromisso 940147/2021

▼ Contrato de Execução e/ou Fornecimento 123

Medição	
Data de Início do Objeto	Situação
14/05/2021	Em Elaboração
Data de Início da Medição	Data Fim da Medição
14/05/2021	14/05/2021

1.1 - Submeta: Execução da Pavimentação da Parte 1

— Frente de Obra: RUA A

Ao clicar na linha de descrição dos eventos, essa será detalhada, possibilitando uma melhor análise do que foi executado.

Evento / Descrição do Serviço	Valor do Evento (R\$)	Qtde.	Unid.	Concluído Empresa	Concluído Conveniente	Concluído Concedente
▼ SERVIÇOS PRELIMINARES	7.700,00			☐		
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO		20	M2			
SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE		3000	M2			
▶ MOVIMENTO DE TERRA	1.800,00			☐		
▶ PAVIMENTAÇÃO	44.594,00			☐		
▶ RAMPAS DE ACESSIBILIDADE	6.750,00			☐		
▶ DIVERSOS	1.456,00			☐		

Clique

1.1 - Submeta: Execução da Pavimentação da Parte 1

— Frente de Obra: RUA A

A medida que for analisando os eventos, o usuário com perfil “Operacional da Empresa”, vai registrando o que foi realizado, clicando no botão indicado.

Evento / Descrição do Serviço	Valor do Evento (R\$)	Qtde.	Unid.	Concluído	Concluído	Concluído
				Empresa	Conveniente	Concedente
▶ SERVIÇOS PRELIMINARES	7.700,00			☒		
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO		20	M2			
SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE		3000	M2			
▶ MOVIMENTO DE TERRA	1.800,00			☒		
REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA		1500	M2			
▶ PAVIMENTAÇÃO	44.594,00			☒		
Meio-fio em pedra granítica, rejuntado c/argamassa cimento e areia 1:3		400	M			
Pavimento em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 (pedras pequenas - 30 a 35 pecas por m2)		500	M2			
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016		25	M3			
Fornecimento e aplicação de meio fio em pedra granítica (cordão de travamento)		20	M			
Piso podotátil em placa cimentícia, assentado com argamassa em calçada do passeio público		80	M2			
▶ RAMPAS DE ACESSIBILIDADE	6.750,00			☐		
▶ DIVERSOS	1.456,00			☐		

Clique

Realizado

Não Realizado

Lembrando que esse acompanhamento é realizado por eventos, assim, o usuário só pode registrar se executou ou não o evento.

— Frente de Obra: RUA B

Evento / Descrição do Serviço	Valor do Evento (R\$)	Qtde.	Unid.	Concluído	Concluído	Concluído
				Empresa	Conveniente	Concedente
▶ SERVIÇOS PRELIMINARES	7.700,00			☐		
▶ MOVIMENTO DE TERRA	1.800,00			☐		
▶ PAVIMENTAÇÃO	44.594,00			☐		
▶ RAMPAS DE ACESSIBILIDADE	6.750,00			☐		

Voltar

Salvar Rascunho

Assinar

1.1 - Submeta: Execução da Pavimentação da Parte 1

Assinatura Responsável Técnico

CPF	Nome	Perfil	CREA/CAU	Data da Assinatura
-----	------	--------	----------	--------------------

Frente de Obra: RUA A

Evento / Descrição do Serviço	Valor do Evento (R\$)	Qtde.	Unid.	Concluído Empresa	Concluído Conveniente	Concluído Concedente
SERVIÇOS PRELIMINARES	7.700,00			☒		
MOVIMENTO DE TERRA	1.800,00			☒		
PAVIMENTAÇÃO	44.594,00			☒		
RAMPAS DE ACESSIBILIDADE	6.750,00			☐		
DIVERSOS	1.456,00			☒		

Frente de Obra: RUA B

Evento / Descrição do Serviço	Valor do Evento (R\$)	Qtde.	Unid.	Concluído Empresa	Concluído Conveniente	Concluído Concedente
SERVIÇOS PRELIMINARES	7.700,00			☒		
MOVIMENTO DE TERRA	1.800,00			☒		
PAVIMENTAÇÃO	44.594,00			☒		
RAMPAS DE ACESSIBILIDADE	6.750,00			☐		
DIVERSOS	1.456,00			☒		

Após registrar a execução ou parte dela, o usuário pode “Salvar Rascunho”, opção que permite apenas registrar as informações para posterior revisão ou complementação.

Total Medição 01 (R\$):	111.100,00
Acumulado Medição 01 (R\$):	111.100,00



/ Empresas / Contratos / Medição / Alterar Medição / Preencher Medição Submeta

Submeta salva com sucesso.

MEDIÇÃO

Preencher Medição 1

Informe Abaixo quais Eventos foram Concluídos na Medição

Ao salvar rascunho os registro podem ser revistos ou excluídos, clicando em "Excluir Rascunho".

Termo de Compromisso 940147/2021

Contrato de Execução e/ou Fornecimento 123

Medição

Data de Início do Objeto
14/05/2021

Data de Início da Medição
14/05/2021

Situação
Em Elaboração

Data Fim da Medição
14/05/2021

O botão "Assinar" só é exibido para o usuário da Empresa que possui o perfil "Operacional da Empresa", que foi cadastrado como Responsável Técnico pela Execução da submeta e que possui uma ART ativa (página 13).

Após revisão das informações registradas, o usuário deve clicar em "Assinar", conforme indicado. Essa Ação registra que o responsável técnico pela execução da empresa reconhece que as informações inseridas estão corretas.

1.1 - Submeta: Execução da Pavimentação da Parte 1

— Frente de Obra: RUA A

Evento / Descrição do Serviço	Valor do Evento (R\$)	Qtde.	Unid.	Empresa	Concluído Conveniente	Concluído Concedente
SERVIÇOS PRELIMINARES	7.700,00			☒		
MOVIMENTO DE TERRA	1.800,00			☒		
PAVIMENTAÇÃO	44.594,00			☒		
RAMPAS DE ACESSIBILIDADE	6.750,00			☒		

Clique

Voltar

Excluir Rascunho

Salvar Rascunho

Assinar

/ Empresas / Contratos / Medição / Alterar Medição / Preencher Medição Submeta

✓ Submeta assinada com sucesso.

✕

MEDIÇÃO

Preencher Medição 1

Informe Abaixo quais Eventos foram Concluídos na Medição

▼ Termo de Compromisso 940147/2021

▼ Contrato de Execução e/ou Fornecimento 123

Após assinar, clique em “Voltar”, conforme indicado.

Medição

Data de Início do Objeto
14/05/2021

Situação
Em Elaboração

Data de Início da Medição
14/05/2021

Data Fim da Medição
14/05/2021

1.1 - Submeta: Execução da Pavimentação da Parte 1

Assinatura Responsável Técnico

CPF	Nome	Perfil	CREA/CAU	Data da Assinatura
				14/05/2021 - 17:55:15

PLA A

ção do Serviço

Valor do Evento (R\$)

Qtde.

Unid.

Concluído

Concluído

Concluído

Empresa

Conveniente

Concedente

7.700,00



Voltar

Salvar Rascunho

Assinar

Clique

O usuário poderá salvar essa medição clicando em “Salvar Medição”. Essa opção apenas registra no sistema o que foi ou não realizado.

▼ Termo de Compromisso 940147/2021

▼ Contrato de Execução e/ou Fornecimento 123

Medição Observações

Medição

Data de Início do Objeto

14/05/2021

Data no formato dd/mm/aaaa

Data de Início da Medição

14/05/2021

Situação

Em Elaboração

Data Fim da Medição

14/05/2021

Data no formato dd/mm/aaaa

Submetas

Para enviar a medição para análise do fiscal do conveniente, o usuário deverá clicar em “Enviar Medição”, conforme indicado.

Descrição	Valor (R\$)	Realizado	Empresa		Conveniente		Concedente		Ações
			R\$	%	R\$	%	R\$	%	
1.1 - Submeta: Execução da Pavimentação da Parte 1	124.600,00	Período	111.100,00	89,17					
		Acumulado	111.100,00	89,17					
Total	124.600,00	Período	111.100,00	89,17					
		Acumulado	111.100,00	89,17					

Exportar o conteúdo dessa tabela no formato [TXT](#), [CSV](#), [XLS](#), [PDF](#) ou [XML](#)

Itens por pág. 10

Voltar

Salvar Medição

Enviar Medição

Clique

MEDIÇÃO

Medição 1

Escolha uma submeta abaixo para realizar medições.

▼ Termo de Compromisso 940147/2021

▼ Contrato de Execução e/ou Fornecimento 123

Medição

Observações

Medição

Data de Início do Objeto

14/05/2021

Data no formato dd/mm/aaaa

Data de Início da Medição

14/05/2021

Situação

Em Elaboração

Data Fim da Medição

14/05/2021

Data no formato dd/mm/aaaa

Submetas

Descrição	Valor (R\$)	Realizado	Empresa		Conveniente		Concedente		Ações
			R\$	%	R\$	%	R\$	%	
1.1 - Submeta: Execução da Pavimentação da Parte 1	124.600,00	Período	111.100,00	89,17					
		Acumulado	111.100,00	89,17					
Total	124.600,00	Período	111.100,00	89,17					
		Acumulado	111.100,00	89,17					

Exportar o conteúdo dessa tabela no formato [TXT](#), [CSV](#), [XLS](#), [PDF](#) ou [XML](#)

Itens por pág. 10

Voltar

Salvar Medição

Enviar Medição

Conclusão da Medição

Deseja confirmar a **conclusão** da medição e envio para fiscalização?

Não

Sim

Clique

Clique em "SIM" para confirmar a conclusão da medição e o envio para fiscalização.

✓ Medição enviada com sucesso.

MEDIDAÇÃO

Medição 1

Escolha uma submeta abaixo para detalhar a medição

Medições enviadas, perceba que a única ação possível agora é a consulta dos dados.

▼ Termo de Compromisso 940147/2021

▼ Contrato de Execução e/ou Fornecimento 123

Medição

Observações

Medição

Data de Início do Objeto
14/05/2021

Situação
Enviada para o Conveniente

Data de Início da Medição
14/05/2021

Data Fim da Medição
14/05/2021

Submetas

Descrição	Valor (R\$)	Realizado	Empresa		Conveniente		Concedente		Ações
			R\$	%	R\$	%	R\$	%	
1.1 - Submeta: Execução da Pavimentação da Parte 1	124.600,00	Período	111.100,00	89,17					🔍
		Acumulado	111.100,00	89,17					
		Total	124.600,00						

Voltar

Clique

Caso deseje cancelar o envio, clique em "Voltar".

🏠 / Empresas / Contratos / Medição / Listar Medição

MEDIÇÃO
Medições
Lista de Medições Efetuadas

▼ Termo de Compromisso 940147/2021

▼ Contrato de Execução e/ou Fornecimento 123

Medições

Histórico

Clique

Para saber quem enviou a medição, clique em “Histórico”, conforme indicado.

Medições

Criar Medição

Número	Período	Realizado	Empresa		Conveniente		Concedente		Situação	Ações
			R\$	%	R\$	%	R\$	%		
1	14/05/2021 a 14/05/2021	Período	111.100,00	89,17						
		Acumulado	111.100,00	89,17						

Para cancelar o envio da medição, clique aqui

Exportar o conteúdo dessa tabela no formato [TXT](#), [CSV](#), [XLS](#), [PDF](#) ou [XML](#)

Itens por pág. 10

« ‹ 1 › »

Para novas medições repita os passos anteriores

Voltar

MEDIÇÃO

Medições

Lista de Medições Efetuadas

▼ Termo de Compromisso 940147/2021

▼ Contrato de Execução e/ou Fornecimento 123

Medições

Histórico

Histórico das Medições

Data/Hora	Perfil	Responsável	Medição	Situação da Medição
14/05/2021 17:57:43	Empresa	Usuário	1	Enviada para o Conveniente

Exportar o conteúdo dessa tabela no formato [TXT](#), [CSV](#), [XLS](#), [PDF](#) ou [XML](#)

Itens por pág. 10  « < 1 > »



Voltar

DÚVIDAS

- Antes de enviar seu questionamento, verifique se sua dúvida não pode ser sanada com as orientações aqui disponibilizadas.
- Caso as informações não solucionem seu questionamento, a equipe de atendimento disponibiliza opções para o registro de suas manifestações.
- **0800-978-9008** - (segunda-feira a sexta-feira, das 8h às 18h)
- <https://portaldeservicos.economia.gov.br>

